


R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.r.l/
Indra Italia S.p.A /Intellera Consulting S.r.l.

Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3

Verbale Riunione SILF-Evolution

SPCL3-RegCam_SILF Evolution-Verbale Riunione
Avanzamento Attività_20220318



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0154514 22/03/2022 08,52

Mitt. : 5011 DG per l'istruzione le formazioni

Dest. : ALMAVIVA S.P.A

Classifica : E4.11. Fascicolo : 15 del 2022



Regione Campania

PROGETTO DI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA

SILF Evolution

Verbale di Riunione

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 3

Almaviva

Almawave



indra

intellera
consulting

Versione 1.0
18/03/2022

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/
Indra Italia S.p.A/ Intellera Consulting S.r.l.

Pagina
1 di 3

R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.r.l/
Indra Italia S.p.A /Intellera Consulting S.r.l.
Verbale Riunione SILF-Evolution

Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 3
SPCL3-RegCam_SILF Evolution-Verbale Riunione
Avanzamento Attività_20220318

Oggetto:	Stato avanzamento attività di progetto e proposta proroga temporale.		
Luogo:	Regione Campania DG. 11 – Centro Direzionale Is. A3	Data/Ora:	18/03/2022 – 11.00
	Pasquale Micera	Regione Campania DG11	
	Susy Veneziano	Regione Campania DG11	
	Ettore De Maio	RTI- Almaviva	
	Mazzarelli Stefano	RTI- Almaviva	
	Rossella Terlizzi	RTI- Almaviva	

Riferimenti

Identificativo	Titolo/Descrizione
Contratto Quadro	SPCL3-RegioneCampania_SILFEvolution- ProgettoFabbisogni-1.0
Contratto Esecutivo CIG	8534170BDD
SPCL3-RegioneCampania_SILFEvolution-PianoFabbisogni-1.0	Piano dei Fabbisogni
SPCL3-RegioneCampania_SILFEvolution-ProgettoFabbisogni-1.0	Progetto dei Fabbisogni
20220318 - SILF Evolution - Project Status_v1.0	Status Progetto

SR
aw
A
M
P

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0154514 22/03/2022 08,52

Mitt. : 5011 DG per l'istruzione 1a formezi....

Dest. : ALMAVIVA S.P.A

Classifica : 54.11. Fascicolo : 15 del 2022



Argomenti discussi:

In riferimento al progetto SILF-Evolution (CIG 8534170BDD), in data 18/03/2022 alle ore 11:00, si è tenuta una riunione presso la sede Regione Campania DG. 11 – Centro Direzionale Is. A3, con lo scopo di analizzare lo stato di realizzazione delle attività previste dal Progetto dei Fabbisogni.


Il RTI mostra evidenza degli avanzamenti svolti nel periodo, per ciascun ambito di sviluppo.

Al fine di consentire l'adozione del modello emanato dalle nuove Linee Guida, in merito al processo di Accreditamento degli Enti di Formazione, e per dare supporto ai nuovi assetti organizzativi dei Centri per l'Impiego, il RUP, il DEC e il RTI condividono un piano aggiornato delle attività, senza ulteriori oneri economici da parte dell'Amministrazione, da sottoporre al Direttore Generale, al fine di ricorrere ad una proroga temporale al 30/09/2022, come previsto dal contratto quadro Consip all'art.5.2.



Alle ore 12:00 la seduta viene chiusa.

18/03/2022 Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Campania DG. 11



Per la RTI



Almaviva
digitale assoluto



SILF Evolution

Project Status


Marzo 2022

SILF Evolution



Ritardo

Le attività di **conduzione e manutenzione** proseguono **regolarmente**. Nella prima metà di Marzo sono stati **definiti gli ambiti di tutti i Fabbisogni contenuti all'interno del progetto**. In particolare è stato definito l'ambito **Repertorio, evoluzione APP** ed il contenuto delle **MEV**. E' stato completato il **collaudo della Fase 1 di PTV**.

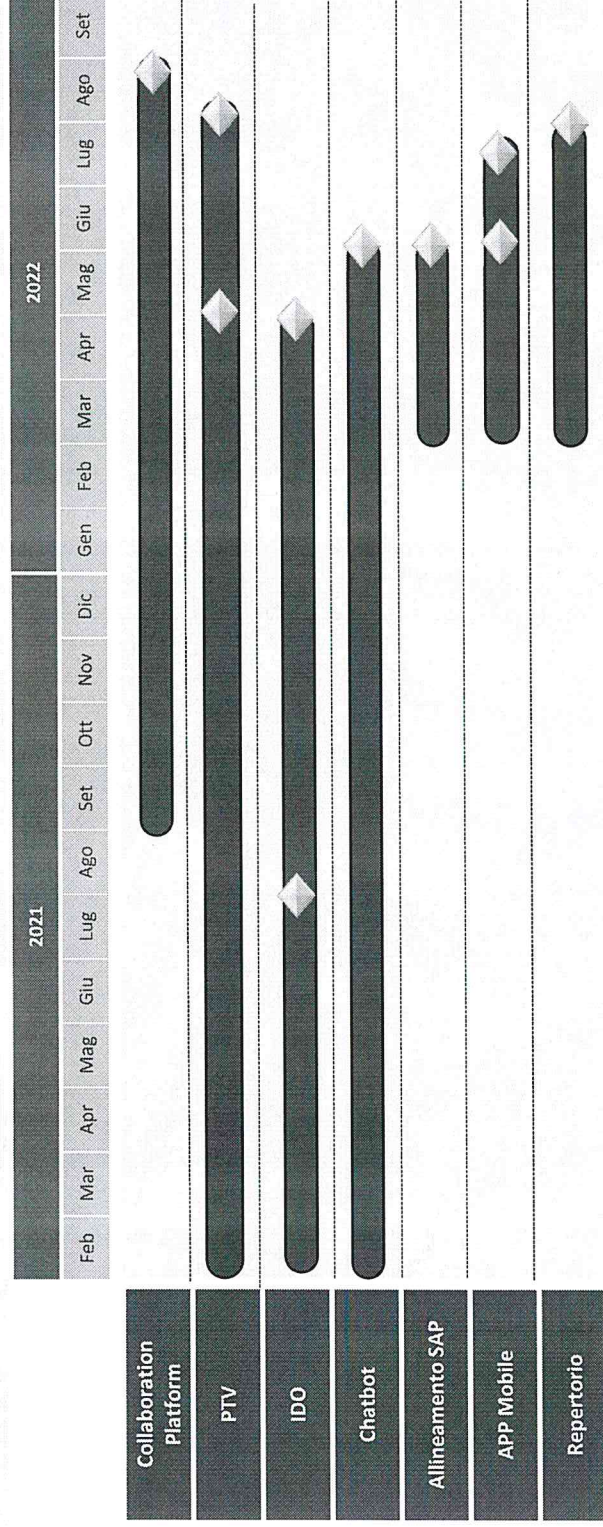


PUNTI DI ATTENZIONE

E' necessario controllare sistematicamente gli avanzamenti dei singoli Piani di Lavoro, affinché lo svolgimento delle attività rispetti le pianificazioni.

In ambito PTV è necessario ricevere un riscontro dall'Amministrazione relativamente alle tematiche identificate da formulare in FAQ (riportate nel file consegnato all'amministrazione "PTV - FAQ IVR Conversazionale_19012022_1.0");

Le attività formative degli utenti appartenenti ai CPI pilota previste per il sistema PTV devono essere concordate e pianificate entro il 31/03/2022

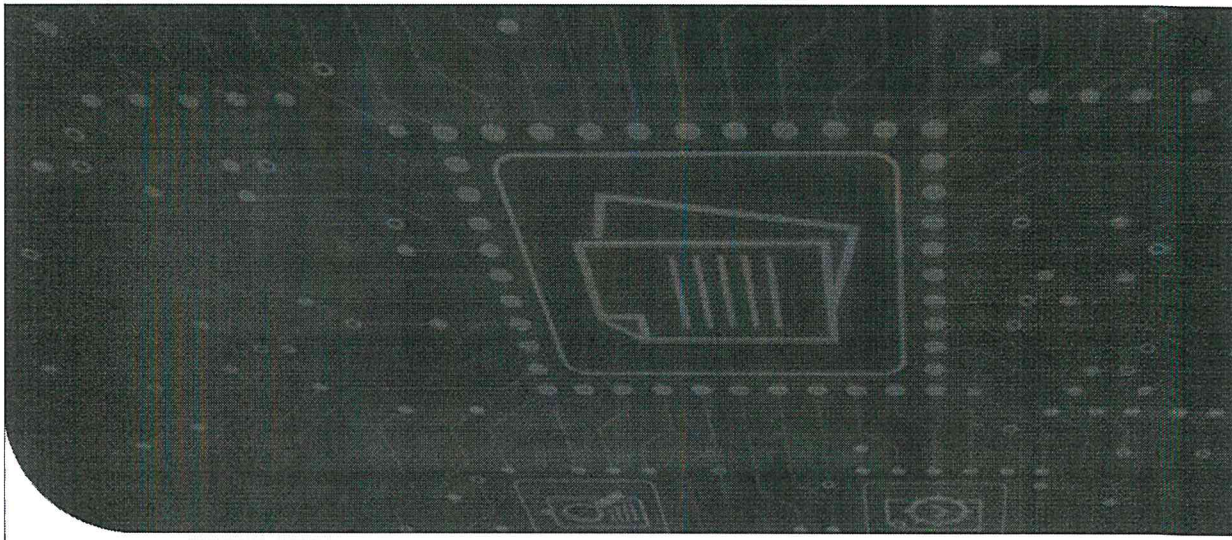



Collaboration Platform



STATO DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA' CONCLUDE



- Approvazione dell'analisi funzionale di dettaglio
- Approvazione del progetto grafico relativo al modulo «Chat e Discussioni»
- Predisposizione delle componenti di base del sistema e sviluppo integrazione con il sistema WebEx

ATTIVITA' IN CORSO



- Progettazione grafica relativa ai restanti moduli del sistema: Rubrica, Incarichi, Comunicazioni, Segnalazioni, Profile Manager.
- Sviluppo dell'autenticazione con SPID in Single Sign On con le altre applicazioni della piattaforma SILF
- Sviluppo del modulo «Chat e Discussioni»

ROADMAP



- Entro il 30/04/2022 è prevista la consegna del documento finale di progettazione grafica e la conclusione dello sviluppo del modulo «Chat e Discussioni»
- La conclusione dello sviluppo del modulo «Rubrica» è previsto entro il 10/06, dei moduli «Incarichi» e «Comunicazioni» è previsto per il 05/07/2022, i moduli «Segnalazioni» e «Profile Manager» per il 30/07/2022



STATO DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA' CONCLUSE

- Sono **concluse** le attività previste per la **Fase 1**
- Il sistema realizzato durante la Fase 1 è stato **collaudato**

ATTIVITA' IN CORSO

- Addestramento** del modello per la Fase 2
- Sviluppo** della piattaforma previsto per la **Fase 2**
- Configurazione degli utenti pilota sui quali avviare la messa in esercizio della Fase 1 del sistema

ROADMAP

- Prevista entro il 30/04/2022 la **messa in esercizio** della piattaforma **Fase 1**. Entro la stessa data è previsto inoltre lo svolgimento delle attività di **formazione** degli utenti
- Rilascio conclusivo della piattaforma **Fase 2** previsto entro il 31/07/2022

Almaviva

IDO



STATO DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA' CONCLUSE

- La soluzione è stata **realizzata e rilasciata** in ambiente di collaudo (motore IDO e web app offerta congrua)

ATTIVITA' IN CORSO

- Sviluppo autenticazione tramite **SPID**

ROADMAP

- Rilascio in collaudo della soluzione finale previsto per il 30/04/2022



STATO DELLE ATTIVITA'



ATTIVITA' CONCLUDE

- Addestramento del modello di **Machine Learning**, definizione delle **domande** create sulla base dei corsi presenti sul Catalogo, sul Repertorio, sul Codice ATECO Istat, sulla Classificazione delle Unità Professionali
- Creazione del flusso di dialogo, per permettere al bot di poter gestire e smistare correttamente le domande (Fase 1 e Fase 2)



ATTIVITA' IN CORSO

- Test del modello sulla base di un **nuovo set di domande** e definizione output della risposta
- Restyling grafico** della chat e del bottone presente sul portale SILF



ROADMAP

- Entro il 31/03/2022 sarà sottoposta all'Amministrazione la **proposta grafica**.
- Fase di tuning/addestramento del modello a valle dei test in corso.
- Entro il 31/03/2022 sarà condivisa con l'Amministrazione una proposta sull'**output della risposta del BOT** sui corsi richiesti.

Almaviva

Allineamento SAP



STATO DELLE ATTIVITA'



ATTIVITA' IN CORSO

- Avvio attività di **analisi** a valle della ricezione del file con le attività rendicontate nella prima fase del programma Garanzia Giovani
- Attività di matching con le politiche presenti nelle SAP dei giovani interessati per individuare il delta da **sanare massivamente** attraverso una **procedura automatica** che dovrà recuperare tutti i dati previsti dallo standard SAP



ROADMAP

- Termine delle attività di bonifica previsto entro il 31/05/2022

APP Mobile – Area riservata degli Utenti



STATO DELLE ATTIVITA'



ATTIVITA' CONCLUDE

- E' stato definito ed approvato l'ambito di dettaglio dell'attività che prevede l'evoluzione dell'area riservata degli utenti all'interno del Portale SILF e l'integrazione dei nuovi servizi di **conferma iscrizione e conferma partecipazione**. E' prevista inoltre l'integrazione nativa nel portale dei **servizi di consultazione delle vacancy e delle offerte formative**. Saranno infine integrati in Single Sign On i **servizi per il lavoro**.



ATTIVITA' IN CORSO

- Adeguamento delle funzioni di accesso al sistema e del sistema di indirizzamento verso l'Identity Server della Regione Campania al fine di completare l'**integrazione in Single Sign On** del portale Web con il sistema ClicLavoro
- Attività di analisi di dettaglio e progettazione grafica dei **nuovi servizi** da sviluppare



ROADMAP

- Conclusione dell'attività di **analisi di dettaglio** prevista per il 15/04/2022
- Rilascio del servizio di **conferma iscrizione** ai corsi di formazione prevista per il 06/05/2021
- Rilascio del servizio di **conferma partecipazione** alle lezioni entro il 20/05/2021 e termine attività entro il 31/07/2021

Evoluzione Sistema Repertorio delle Qualificazioni



STATO DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA' CONCLUSE



- Creazione ambiente di sviluppo e collaudo su piattaforma TIM Cloud
- Consegna del documento di assessment previsto dal Progetto dei Fabbisogni

ATTIVITA' IN CORSO



- Analisi tecnica della soluzione

ROADMAP



- Rilascio entro il 31/05/2022 della Fase 1 di progetto che prevede lo sviluppo dell'accesso al sistema tramite SPID, la gestione dinamica delle annualità, l'integrazione della tipologia d'esame e la gestione delle domande d'esame
- Rilascio entro il 31/07/2022 della Fase 2 di progetto che prevede la gestione dei laboratori e delle strumentazioni, i percorsi IFP, la gestione dei requisiti minimi di accesso, l'adeguamento dei servizi REST e i miglioramenti UX richiesti dall'Amministrazione

Almaviva
digitale assoluto
